Westerholz, Weißenberger Straße

Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG
Am Funkturm 25
29525 Uelzen
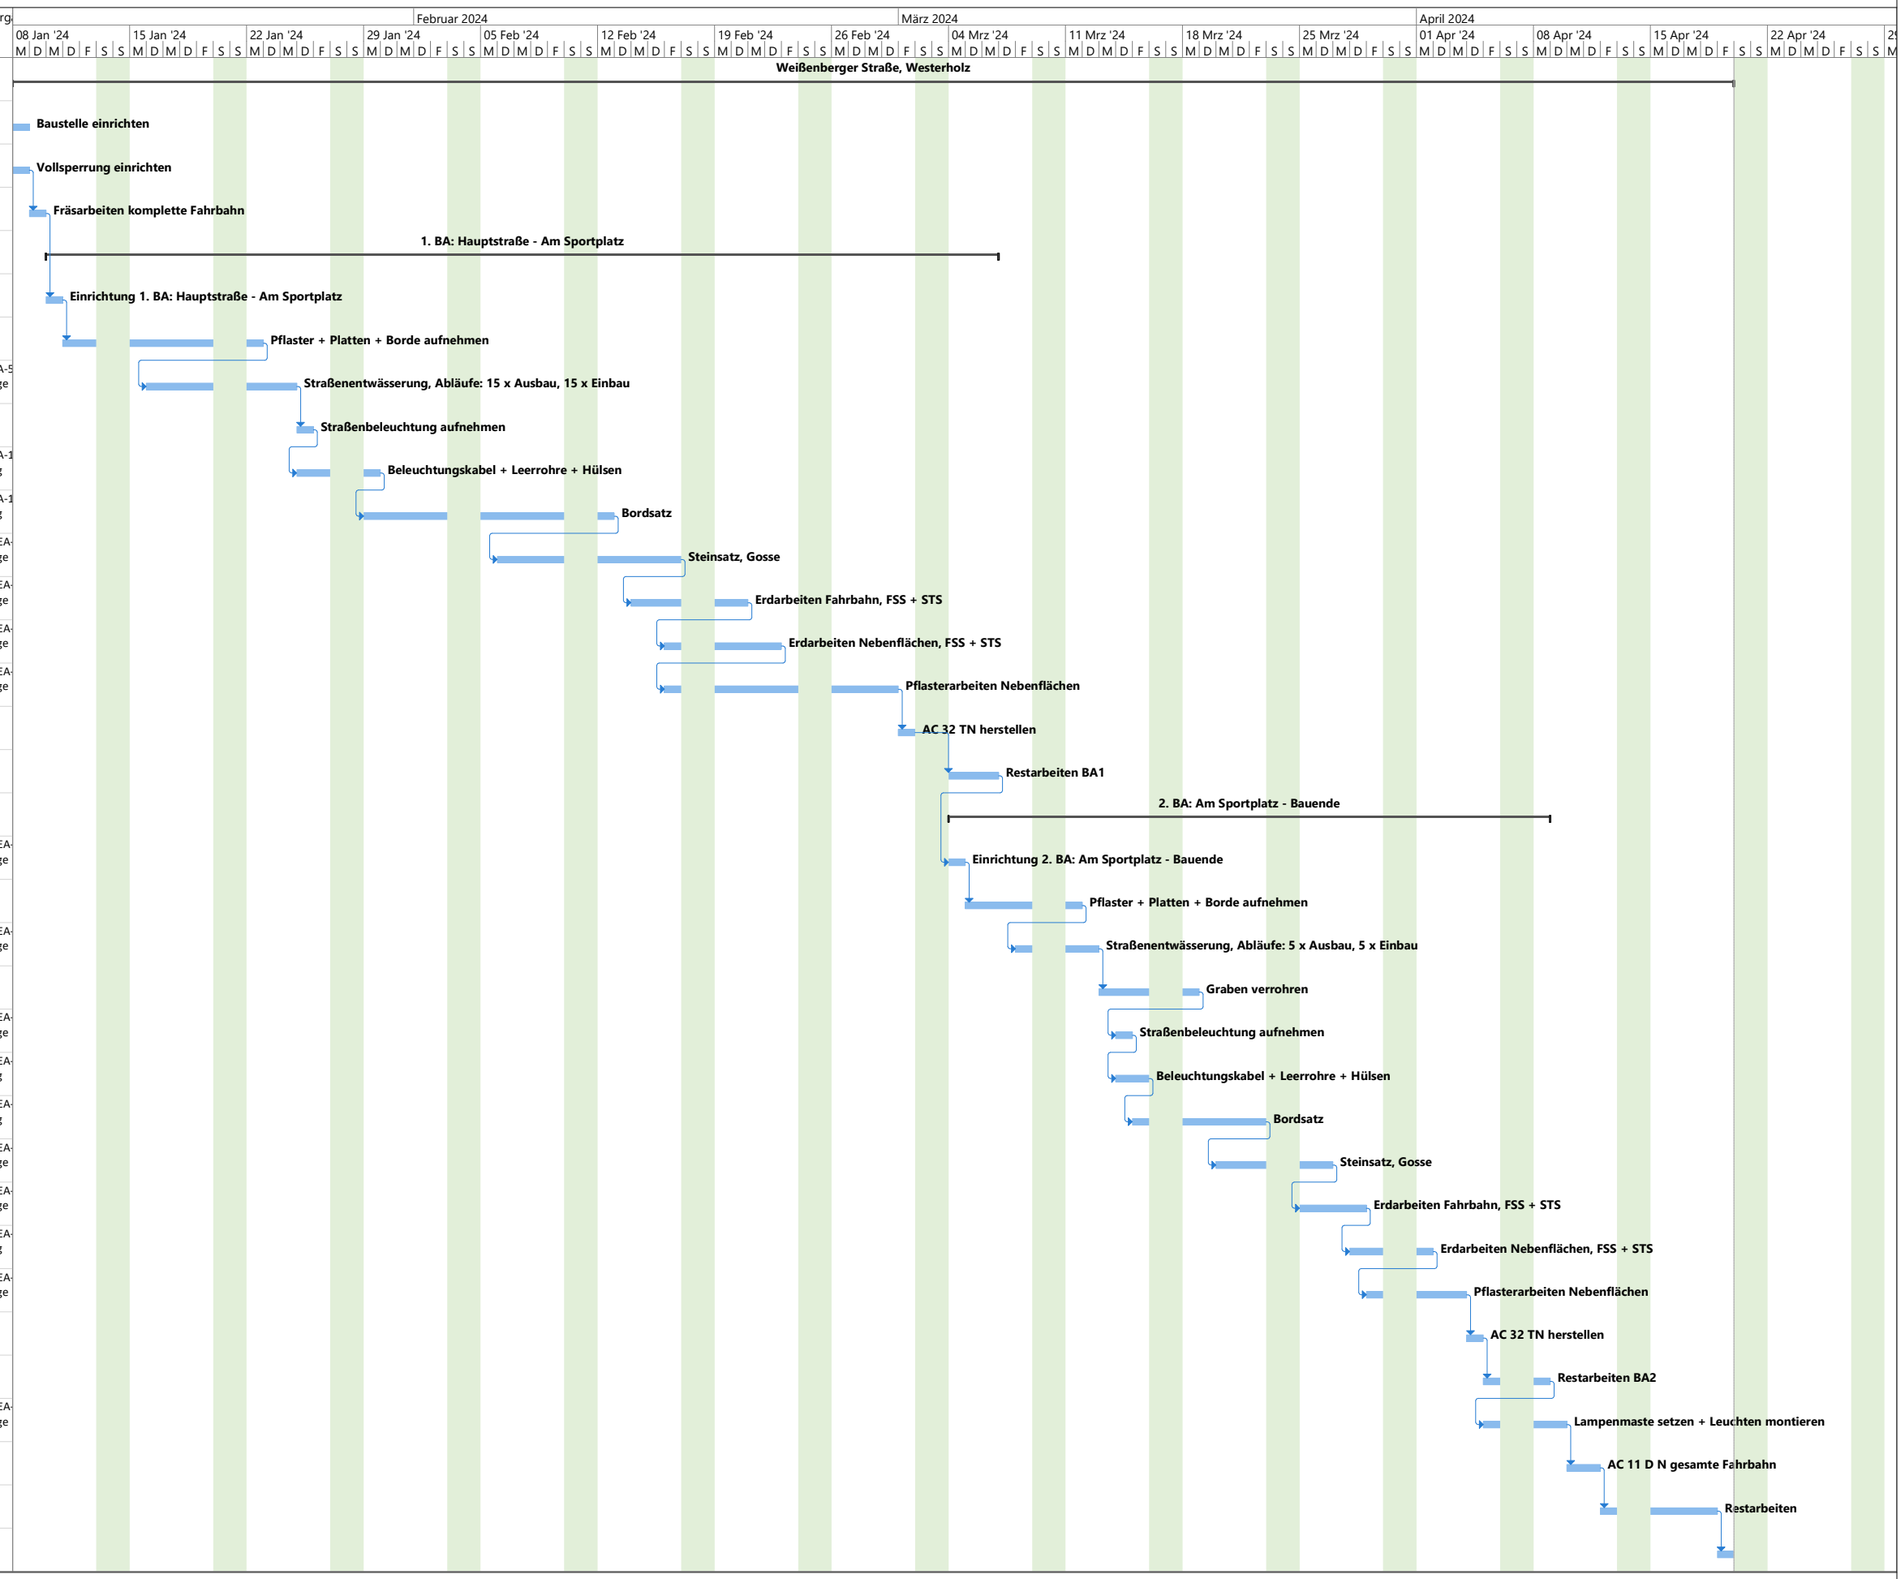
Nr.	Vorg.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorg.
0		**Weißenberger Straße, Westerholz**	**75 Tage**	**Mon 08.01.**	**Fre 19.04.**	
1		Baustelle einrichten	1 Tag	Mon 08.01.24	Mon 08.01.24	
2		Vollsperrung einrichten	1 Tag	Mon 08.01.24	Mon 08.01.24	
3		Fräsarbeiten komplette Fahrbahn	1 Tag	Die 09.01.24	Die 09.01.24	2
4		**1. BA: Hauptstraße - Am Sportplatz**	**41 Tage**	**Mit 10.01.24**	**Mit 06.03.24**	
5		Einrichtung 1. BA: Hauptstraße - Am Sportplatz	1 Tag	Mit 10.01.24	Mit 10.01.24	3
6		Pflaster + Platten + Borde aufnehmen	8 Tage	Don 11.01.24	Mon 22.01.24	5
7		Straßenentwässerung, Abläufe: 15 x Ausbau, 15 x Einbau	7 Tage	Die 16.01.24	Mit 24.01.24	6EA-5 Tage
8		Straßenbeleuchtung aufnehmen	1 Tag	Don 25.01.24	Don 25.01.24	7
9		Beleuchtungskabel + Leerrohre + Hülsen	3 Tage	Don 25.01.24	Mon 29.01.24	8EA-1 Tag
10		Bordsatz	11 Tage	Mon 29.01.24	Mon 12.02.24	9EA-1 Tag
11		Steinsatz, Gosse	9 Tage	Die 06.02.24	Fre 16.02.24	10EA- Tage
12		Erdarbeiten Fahrbahn, FSS + STS	5 Tage	Mit 14.02.24	Die 20.02.24	11EA- Tage
13		Erdarbeiten Nebenflächen, FSS + STS	5 Tage	Fre 16.02.24	Don 22.02.24	12EA- Tage
14		Pflasterarbeiten Nebenflächen	10 Tage	Fre 16.02.24	Don 29.02.24	13EA- Tage
15		AC 32 TN herstellen	1 Tag	Fre 01.03.24	Fre 01.03.24	14
16		Restarbeiten BA1	3 Tage	Mon 04.03.24	Mit 06.03.24	15
17		**2. BA: Am Sportplatz - Bauende**	**26 Tage**	**Mon 04.03.24**	**Mon 08.04.24**	
18		Einrichtung 2. BA: Am Sportplatz - Bauende	1 Tag	Mon 04.03.24	Mon 04.03.24	16EA- Tage
19		Pflaster + Platten + Borde aufnehmen	5 Tage	Die 05.03.24	Mon 11.03.24	18
20		Straßenentwässerung, Abläufe: 5 x Ausbau, 5 x Einbau	3 Tage	Fre 08.03.24	Die 12.03.24	19EA- Tage
21		Graben verrohren	4 Tage	Mit 13.03.24	Mon 18.03.24	20
22		Straßenbeleuchtung aufnehmen	1 Tag	Don 14.03.24	Don 14.03.24	21EA- Tage
23		Beleuchtungskabel + Leerrohre + Hülsen	2 Tage	Don 14.03.24	Fre 15.03.24	22EA- Tag
24		Bordsatz	6 Tage	Fre 15.03.24	Fre 22.03.24	23EA- Tag
25		Steinsatz, Gosse	5 Tage	Mit 20.03.24	Die 26.03.24	24EA- Tage
26		Erdarbeiten Fahrbahn, FSS + STS	4 Tage	Mon 25.03.24	Don 28.03.24	25EA- Tage
27		Erdarbeiten Nebenflächen, FSS + STS	3 Tage	Don 28.03.24	Mon 01.04.24	26EA- Tag
28		Pflasterarbeiten Nebenflächen	4 Tage	Fre 29.03.24	Mit 03.04.24	27EA- Tage
29		AC 32 TN herstellen	1 Tag	Don 04.04.24	Don 04.04.24	28
30		Restarbeiten BA2	2 Tage	Fre 05.04.24	Mon 08.04.24	29
31		Lampenmaste setzen + Leuchten montieren	3 Tage	Fre 05.04.24	Die 09.04.24	30EA- Tage
32		AC 11 D N gesamte Fahrbahn	2 Tage	Mit 10.04.24	Don 11.04.24	31
33		Restarbeiten	5 Tage	Fre 12.04.24	Don 18.04.24	32
34		Baustelle räumen	1 Tag	Fre 19.04.24	Fre 19.04.24	33
